

Sachstand Bauprogramm Radwege 2025

34. Sitzung des Runden Tisches Radverkehr
28. Oktober 2025

Bauprogramm 2025 – Sachstand 15.10.2025



Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs-zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Gebersdorfer Str. zw. Rangastr. und Felsenstr.	5.038.000 €	AfV 06.07.2017 19.02.2020	1.500.000 €	3.538.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2025	baulich fertiggestellt Abrechnung offen
Radweg an Goldbachstr.	150.000 €	nicht erforderlich	150.000 €		2025	Baubeginn 9/2025 bis 11/2025
Kilianstr. Höhe Georg-Buchner-Str.	180.000 €	AfV 12.09.2022	180.000 €		2025 2026	Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 zusammen mit der Senefelder Straße
Cochläusweg, Lückenschluss	150.000 €	AfV 23.09.2021	150.000 €		2025 2026	verschoben in 2026 wg. Hochbaumaßnahme
Bayreuther Str. zw. Rathenauplatz und Berliner Platz	6.620.000 €	06.05.2021	2.448.000 €	4.172.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2026	im Bau
Meuschelstr. zw. Löbleinstr. und Rollnerstr.	568.000 €	19.10.2023	1.320.500 €	149.500 €	2024 -2025	Unterbrechung wg. SUN, Restarbeiten in 2025 Markierung teilweise hergestellt
Löbleinstraße Süd und Maxfeldstr. südl. Goetherstr.	902.000 €	19.10.2023			2025	baulich fertiggestellt Markierung hergestellt
Am Nordostbahnhof	295.000 €	25.05.2023	295.000 €		2024 bis 2025	fertig 5/2025
Kohlenhof-Areal Markierungsplan Kohlenhofstr.	143.000€	16.11.2023	143.000 €		2024 bis 2025	fertig
Gibitzenhofstraße zw. Dianaplatz und Brehmstr.	620.000 €	13.06.2024	620.000 €		2025	Ostseite in 2024 fertiggestellt Westseite 8/2025-10/2025 fertiggestellt
Spohrstraße	998.000 €	18.7.2019	998.000 €		2025 2027	Maßnahme verschoben

Bauprogramm 2025 – Maßnahmen neu

Maßnahme	geschätzte Gesamt- kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Zerzabelshofstr zw. DB-Unterführung - Pastoriusstraße	491.000 €	13.06.2024	150.000 €	341.000 €	2025 - 2026	Maßnahme neu Baubeginn 08/2025 - 04/2026
Zerzabelshofstr zw. Goldbachstr. - DB- Unterführung	441.000 €	21.02.2024	441.000 €		2025 - 2026	Maßnahme neu Baubeginn 08/2025 - 04/2026
Jansenbrücke	1.235.000 €	11.07.2024	733.673 €	501.327 €	2026	Antrag bei ZUG 23.10.2024 evtl. 01.03.2026 Genehmigung Maßnahme in Vorbereitung
Sulzbacher Straße zw. Harmonie- und Rudolphstr.	150.000 €	03.04.2025	150.000 €		2025	Maßnahme im Zuge VAG Arbeiten
Maximilianstr. (Kreuzung Adam-Klein-Str.) zw. Jansenbrücke und Fürther Str.	1.289.000 €	20.07.2023	911.981 €	377.019 €	2024 2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Bauzeit etwa 4/2026 - 10/2026 Objektplan genehmigt
Oelser Straße	1.823.000 €	17.03.2022	661.350 €	1.161.650 €	2025 2026	Grunderwerb konnte trotz langwieriger Verhandlungen nicht vollzogen werden. Daran hängt die Umsetzung der Maßnahme.

Bauprogramm 2025 Sachstand 10.10.2025




Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV- Beschluss	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
<u>Fahrradstraßen</u>						
1. BA RSV N-Er Friedrichstr., Schweppermannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg	2.763.000 €	Ferien- ausschuss 22.04.2020	1.100.000 €	1.663.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2026	im Bau viele Verzögerungen wegen Spartenverlegungen und Fernwärmeausbau Anvisiere Fertigstellung 2026
Sperberstraße (Stufe 2, RVR 3)	968.000 €	11.09.2023	513.545 €	454.455 €	2025	Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 01.08.2024 im Bau von 08/2024 - 10/2025 - baulich fertig Markierung 10/2025
Strindbergstraße (RVR 10)	686.000 €	18.01.2024	357.981 €	328.019 €	2025 - 2026	Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 21.02.2025 Ausschreibung in Vorbereitung
Kleestraße (Stufe2, RVR 14)	658.000 €	16.11.2023	329.981 €	328.019 €	2025	Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 29.7.2025 Baubeginn 9/2025
Schönweißstraße (Stufe 2)	360.000 €	11.09.2023	215.153 €	144.847 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbeschei vom 29.07.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Strauchstraße	1.948.000 €	21.09.2023	969.397 €	978.603 €	2025-- 2026	Antrag bei ZUG 25.06.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Schupfer Straße	404.000 €	18.04.2024	207.574 €	196.426 €	2025-- 2026	Antrag bei ZUG vom 10.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Happurger Straße	194.000 €	18.04.2024	88.863 €	105.137 €	2025-- 2026	Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung

Bauprogramm 2025 Sachstand 10.10.2025



Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV- Beschluss	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
<u>Fahrradstraßen</u>						
Rehhofstraße	597.000 €	11.07.2024	213.135 €	383.865 €	2025- 2026	Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Senefeder Straße	1.466.311 €	14.12.2023	746.545 €	719.766 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Frankenstraße	958.000 €	18.04.2024	306.600 €	651.400 €	2025	Städtebauförderung Bescheid vom 02.07.2025. Verzögerungen wegen Archäologie Baubeginn 9/2025
Am Thoner Espan, Michelstraße	760.000 €	18.04.2024	435.960 €	324.040 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 13.10.2024 In Bearbeitung bei ZUG
Felsenstraße	740.000 €	11.07.2024	293.087 €	446.913 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 13.08.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
<u>neue Maßnahmen</u>						
Forsthofstraße	1.327.667 €	18.04.2024	719.702 €	607.965 €	2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 29.07.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Martinstraße	123.000 €	03.04.2025	123.000 €		2025	Bauzeit 4/25 - 10/25 Verzögerungen wegen N-Ergie
Schleifweg	675.000 €	20.02.2025	610.000 €	65.000 €	2025	Bauzeit 9/25 - 4/26
Sonstiges						
Fahrradbügel	200.000 €		200.000 €			Schätzung

Gebersdorfer Straße

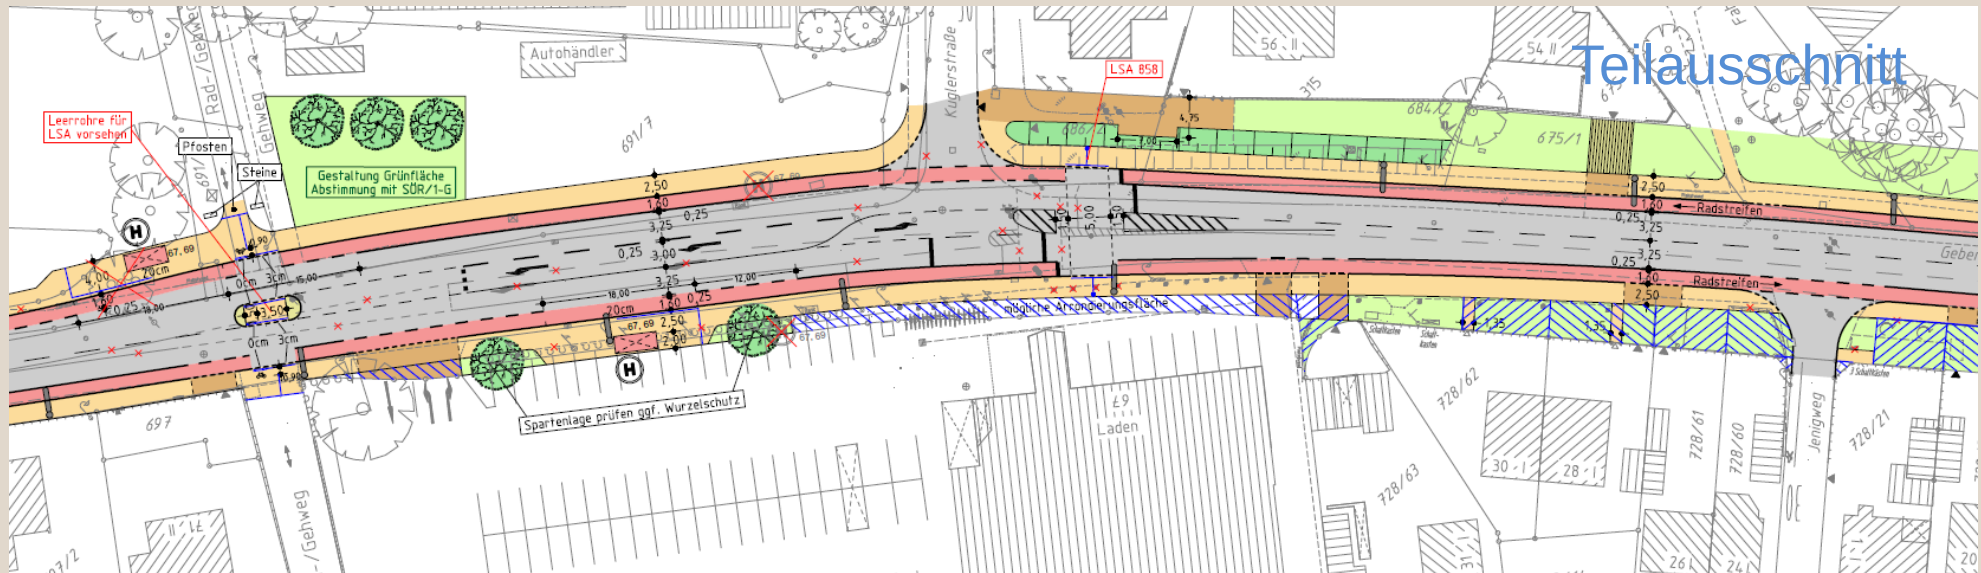


- Ausbau: Ausbaulänge ca. 530 m, Regelbreite 10,20 m
mit beidseitigen Radstreifen, Breite 1,60 m
6 neue Bäume
- Kosten: 5.038.000 € (davon 1.100.000 € aus Radwegeetat)
- Fertigstellung: März 2025

Gebersdorfer Straße



Sperberstraße

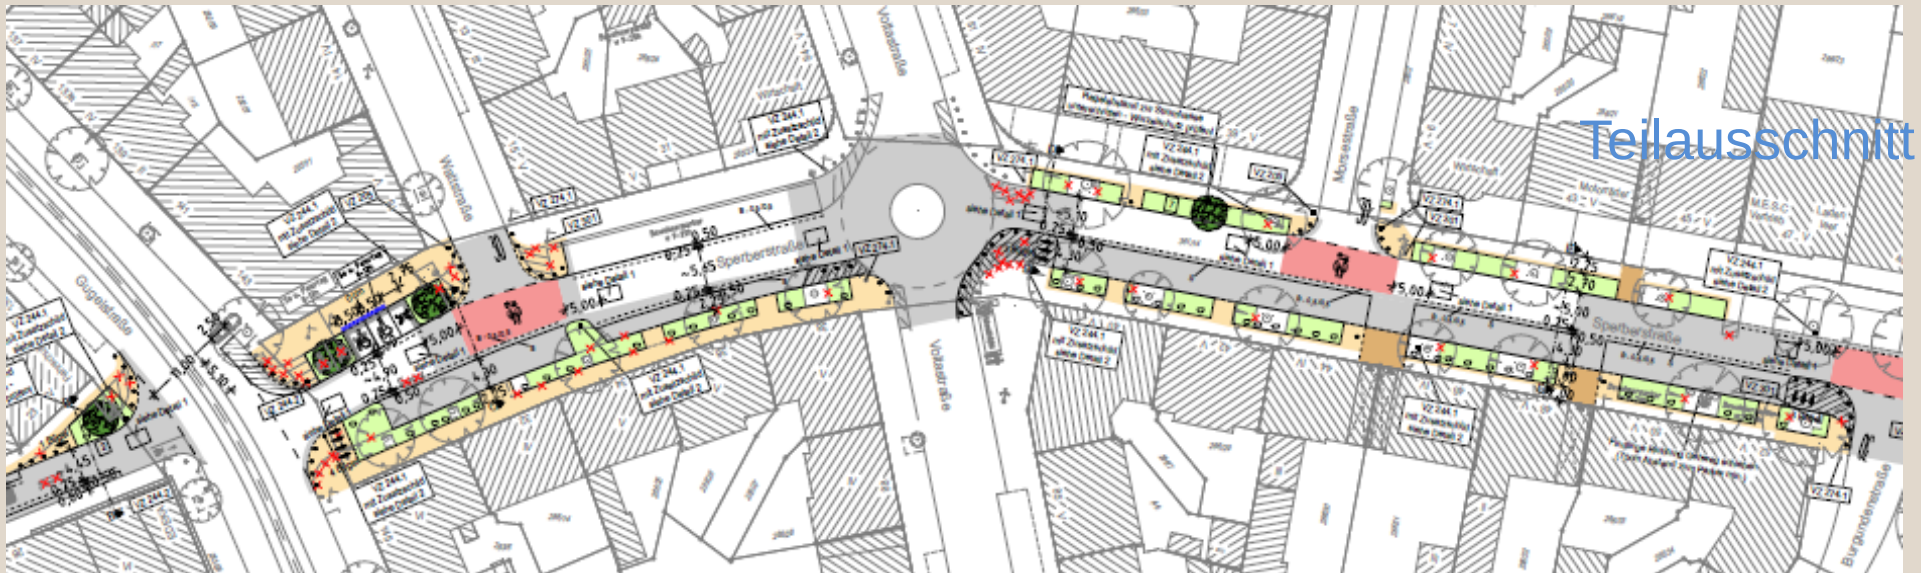


- Ausbau: Fahrradstraße ca. 600 m; Breite ca. 5,80 m
Rotmarkierung in den Einmündungsbereichen
22 neue Fahrradstellplätze
6 neue Bäume
- Kosten: 968.000 € (davon 513.545 € aus Radwegeetat)
- Fertigstellung: Oktober 2025

Sperberstraße



Friedrichstraße - RSV Erlangen

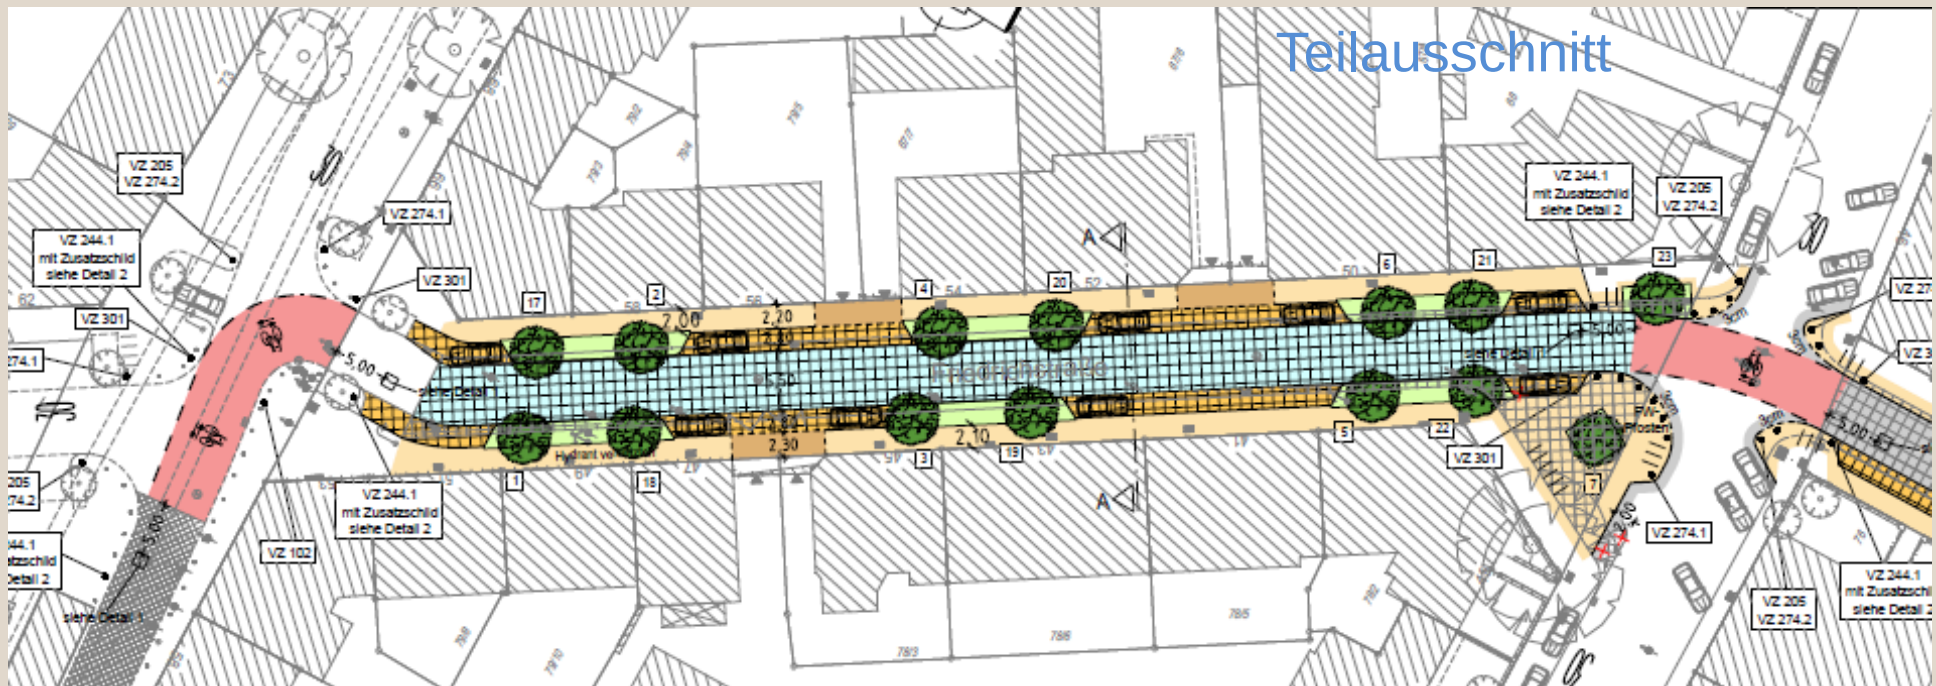


- Ausbau: Fahrradstraße ca. 1.700 m; Breite ca. 5,50 m
Rotmarkierung in den Einmündungsbereichen
26 neue Bäume
- Kosten: 2.763.000 € (davon 1.500.000 € aus Radwegeetat)
- Fertigstellung: Herbst 2026

Friedrichstraße



Löbleinstraße - Meuschelstraße

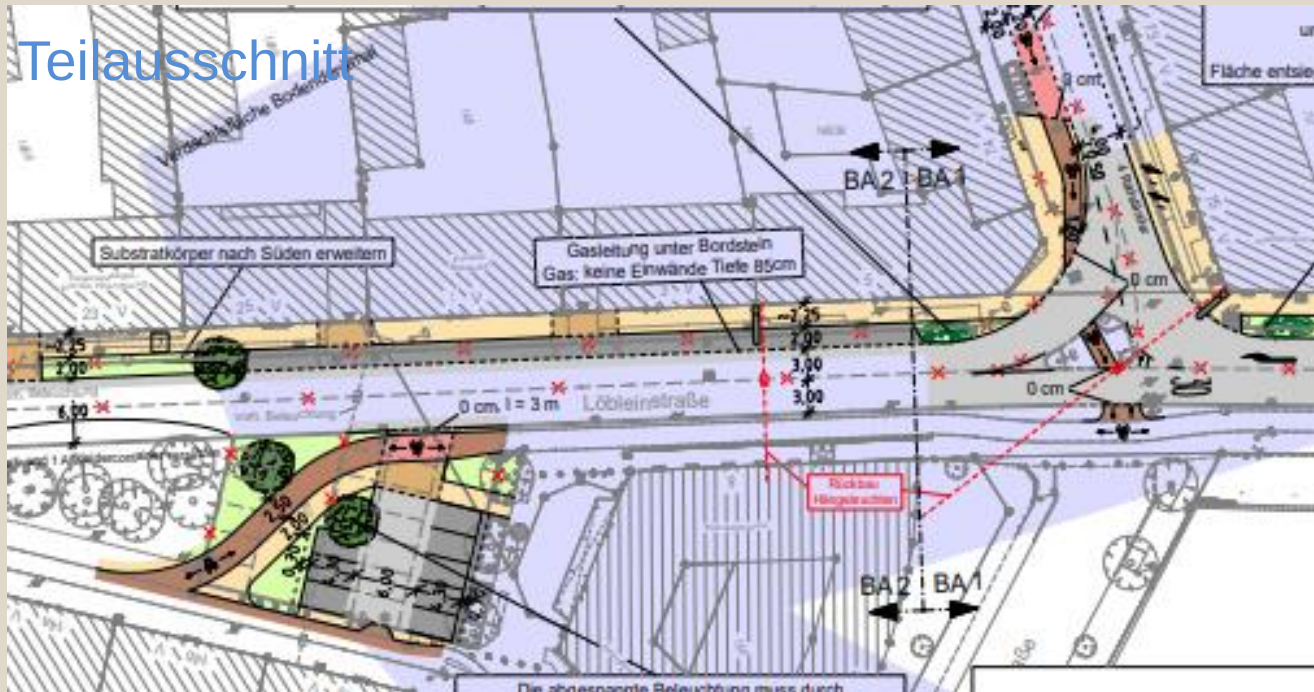

Ausbau: Ausbau eines Zweirichtungsradweges

32 Fahrradstellplätze

6 neue Bäume


Kosten: 1.470.000 €

Fertigstellung: Löbleinstraße fertig, Meuschelstraße Herbst 2025

Löbleinstraße



Gibitzenhofstraße

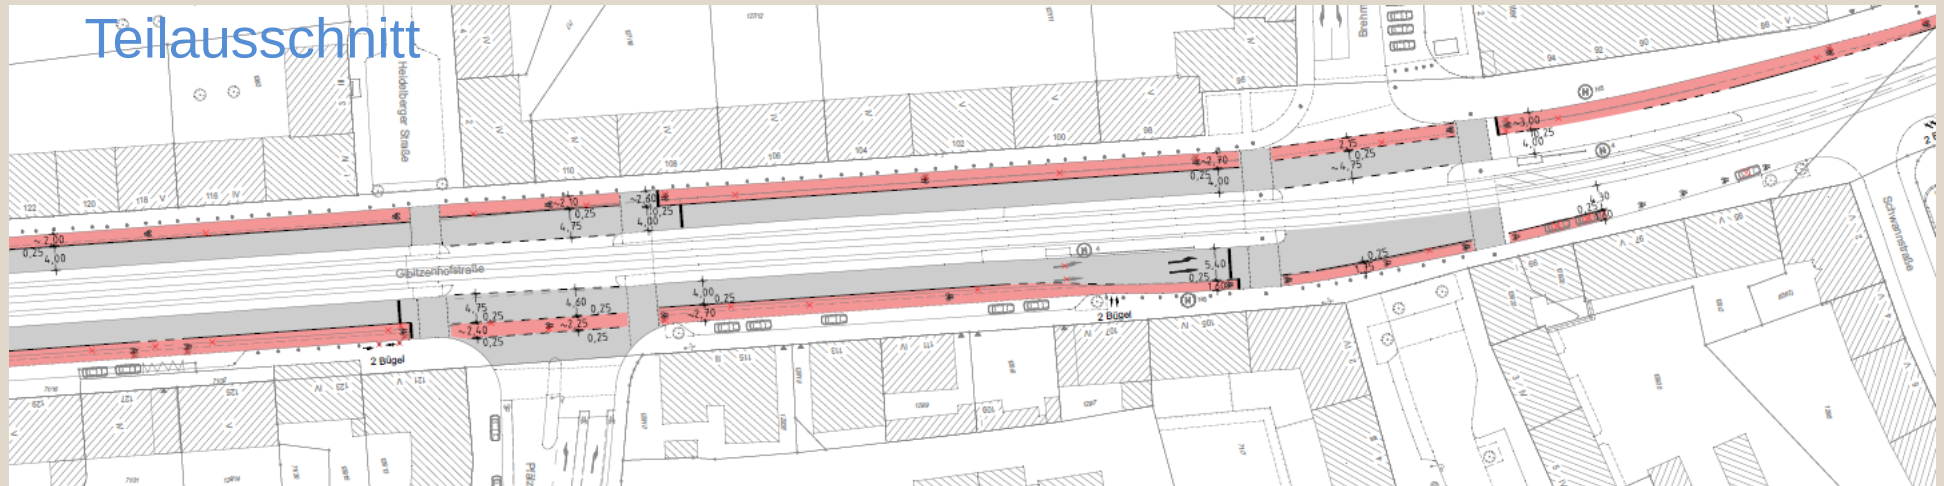

- Ausbau: Deckensanierung, Ausbaulänge ca. 840 m
 Radstreifen Breite von 2,00 m bis 2,75 m (3,00 m)
 Reduzierung der Fahrstreifenbreite auf 4 m
- Kosten: etwa 620.000 €
- Fertigstellung: Ostseite 2024, Westseite 2025

Gibitzenhofstraße



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

SÖR
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
SÖR/1-S/5
Sulzbacher Straße 2-6

90402 Nürnberg

Richard Gußner

+49 (0)9 11 / 2 31-7022
richard.gussner@stadt.nuernberg.de
<http://www.soer.nuernberg.de>
