

Sachstand Bauprogramm Radwege 2025

34. Sitzung des Runden Tisches Radverkehr
28. Oktober 2025

Bauprogramm 2025 – Sachstand 15.10.2025



| Maßnahme | geschätzte Gesamtkosten | AfV-Beschlus | Finanzierung Radwegeetat | Sonstige Finanzierung | Umsetzungs-zeitraum | Stand der Maßnahmenumsetzung |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Gebersdorfer Str. zw. Rangastr. und Felsenstr. | 5.038.000 € | AfV 06.07.2017 19.02.2020 | 1.500.000 € | 3.538.000 € Stadt + Zuschuss | 2023 bis 2025 | baulich fertiggestellt Abrechnung offen |
| Radweg an Goldbachstr. | 150.000 € | nicht erforderlich | 150.000 € | | 2025 | Baubeginn 9/2025 bis 11/2025 |
| Kilianstr. Höhe Georg-Buchner-Str. | 180.000 € | AfV 12.09.2022 | 180.000 € | | 2025 2026 | Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 zusammen mit der Senefelder Straße |
| Cochläusweg, Lückenschluss | 150.000 € | AfV 23.09.2021 | 150.000 € | | 2025 2026 | verschoben in 2026 wg. Hochbaumaßnahme |
| Bayreuther Str. zw. Rathenauplatz und Berliner Platz | 6.620.000 € | 06.05.2021 | 2.448.000 € | 4.172.000 € Stadt + Zuschuss | 2023 bis 2026 | im Bau |
| Meuschelstr. zw. Löbleinstr. und Rollnerstr. | 568.000 € | 19.10.2023 | 1.320.500 € | 149.500 € | 2024 -2025 | Unterbrechung wg. SUN, Restarbeiten in 2025 Markierung teilweise hergestellt |
| Löbleinstraße Süd und Maxfeldstr. südl. Goetherstr. | 902.000 € | 19.10.2023 | | | 2025 | baulich fertiggestellt Markierung hergestellt |
| Am Nordostbahnhof | 295.000 € | 25.05.2023 | 295.000 € | | 2024 bis 2025 | fertig 5/2025 |
| Kohlenhof-Areal Markierungsplan Kohlenhofstr. | 143.000€ | 16.11.2023 | 143.000 € | | 2024 bis 2025 | fertig |
| Gibitzenhofstraße zw. Dianaplatz und Brehmstr. | 620.000 € | 13.06.2024 | 620.000 € | | 2025 | Ostseite in 2024 fertiggestellt Westseite 8/2025-10/2025 fertiggestellt |
| Spohrstraße | 998.000 € | 18.7.2019 | 998.000 € | | 2025 2027 | Maßnahme verschoben |

Bauprogramm 2025 – Maßnahmen neu

| Maßnahme | geschätzte Gesamt- kosten | AfV-Beschlus | Finanzierung Radwegeetat | Sonstige Finanzierung | Umsetzungs- zeitraum | Stand der Maßnahmenumsetzung |
|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Zerzabelshofstr zw. DB-Unterführung - Pastoriusstraße | 491.000 € | 13.06.2024 | 150.000 € | 341.000 € | 2025 - 2026 | Maßnahme neu Baubeginn 08/2025 - 04/2026 |
| Zerzabelshofstr zw. Goldbachstr. - DB- Unterführung | 441.000 € | 21.02.2024 | 441.000 € | | 2025 - 2026 | Maßnahme neu Baubeginn 08/2025 - 04/2026 |
| Jansenbrücke | 1.235.000 € | 11.07.2024 | 733.673 € | 501.327 € | 2026 | Antrag bei ZUG 23.10.2024 evtl. 01.03.2026 Genehmigung Maßnahme in Vorbereitung |
| Sulzbacher Straße zw. Harmonie- und Rudolphstr. | 150.000 € | 03.04.2025 | 150.000 € | | 2025 | Maßnahme im Zuge VAG Arbeiten |
| Maximilianstr. (Kreuzung Adam-Klein-Str.) zw. Jansenbrücke und Fürther Str. | 1.289.000 € | 20.07.2023 | 911.981 € | 377.019 € | 2024 2026 | Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Bauzeit etwa 4/2026 - 10/2026 Objektplan genehmigt |
| Oelser Straße | 1.823.000 € | 17.03.2022 | 661.350 € | 1.161.650 € | 2025 2026 | Grunderwerb konnte trotz langwieriger Verhandlungen nicht vollzogen werden. Daran hängt die Umsetzung der Maßnahme. |

Bauprogramm 2025 Sachstand 10.10.2025




| Maßnahme | geschätzte Gesamt-kosten | AfV- Beschluss | Finanzierung Radwegeetat | Sonstige Finanzierung | Umsetzungs- zeitraum | Stand der Maßnahmenumsetzung |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| <u>Fahrradstraßen</u> | | | | | | |
| 1. BA RSV N-Er Friedrichstr., Schweppermannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg | 2.763.000 € | Ferien- ausschuss 22.04.2020 | 1.100.000 € | 1.663.000 € Stadt + Zuschuss | 2023 bis 2026 | im Bau viele Verzögerungen wegen Spartenverlegungen und Fernwärmeausbau Anvisiere Fertigstellung 2026 |
| Sperberstraße (Stufe 2, RVR 3) | 968.000 € | 11.09.2023 | 513.545 € | 454.455 € | 2025 | Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 01.08.2024 im Bau von 08/2024 - 10/2025 - baulich fertig Markierung 10/2025 |
| Strindbergstraße (RVR 10) | 686.000 € | 18.01.2024 | 357.981 € | 328.019 € | 2025 - 2026 | Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 21.02.2025 Ausschreibung in Vorbereitung |
| Kleestraße (Stufe2, RVR 14) | 658.000 € | 16.11.2023 | 329.981 € | 328.019 € | 2025 | Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 29.7.2025 Baubeginn 9/2025 |
| Schönweißstraße (Stufe 2) | 360.000 € | 11.09.2023 | 215.153 € | 144.847 € | 2025 2026 | Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbeschei vom 29.07.2025 Maßnahme in Vorbereitung |
| Strauchstraße | 1.948.000 € | 21.09.2023 | 969.397 € | 978.603 € | 2025-- 2026 | Antrag bei ZUG 25.06.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung |
| Schupfer Straße | 404.000 € | 18.04.2024 | 207.574 € | 196.426 € | 2025-- 2026 | Antrag bei ZUG vom 10.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung |
| Happurger Straße | 194.000 € | 18.04.2024 | 88.863 € | 105.137 € | 2025-- 2026 | Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung |

Bauprogramm 2025 Sachstand 10.10.2025



| Maßnahme | geschätzte Gesamt-kosten | AfV- Beschluss | Finanzierung Radwegeetat | Sonstige Finanzierung | Umsetzungs- zeitraum | Stand der Maßnahmenumsetzung |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| <u>Fahrradstraßen</u> | | | | | | |
| Rehhofstraße | 597.000 € | 11.07.2024 | 213.135 € | 383.865 € | 2025- 2026 | Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung |
| Senefeder Straße | 1.466.311 € | 14.12.2023 | 746.545 € | 719.766 € | 2025 2026 | Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung |
| Frankenstraße | 958.000 € | 18.04.2024 | 306.600 € | 651.400 € | 2025 | Städtebauförderung Bescheid vom 02.07.2025. Verzögerungen wegen Archäologie Baubeginn 9/2025 |
| Am Thoner Espan, Michelstraße | 760.000 € | 18.04.2024 | 435.960 € | 324.040 € | 2025 2026 | Antrag bei ZUG 13.10.2024 In Bearbeitung bei ZUG |
| Felsenstraße | 740.000 € | 11.07.2024 | 293.087 € | 446.913 € | 2025 2026 | Antrag bei ZUG 13.08.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung |
| <u>neue Maßnahmen</u> | | | | | | |
| Forstthofstraße | 1.327.667 € | 18.04.2024 | 719.702 € | 607.965 € | 2026 | Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 29.07.2025 Maßnahme in Vorbereitung |
| Martinstraße | 123.000 € | 03.04.2025 | 123.000 € | | 2025 | Bauzeit 4/25 - 10/25 Verzögerungen wegen N-Ergie |
| Schleifweg | 675.000 € | 20.02.2025 | 610.000 € | 65.000 € | 2025 | Bauzeit 9/25 - 4/26 |
| | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |
| Fahrradbügel | 200.000 € | | 200.000 € | | | Schätzung |

Gebersdorfer Straße

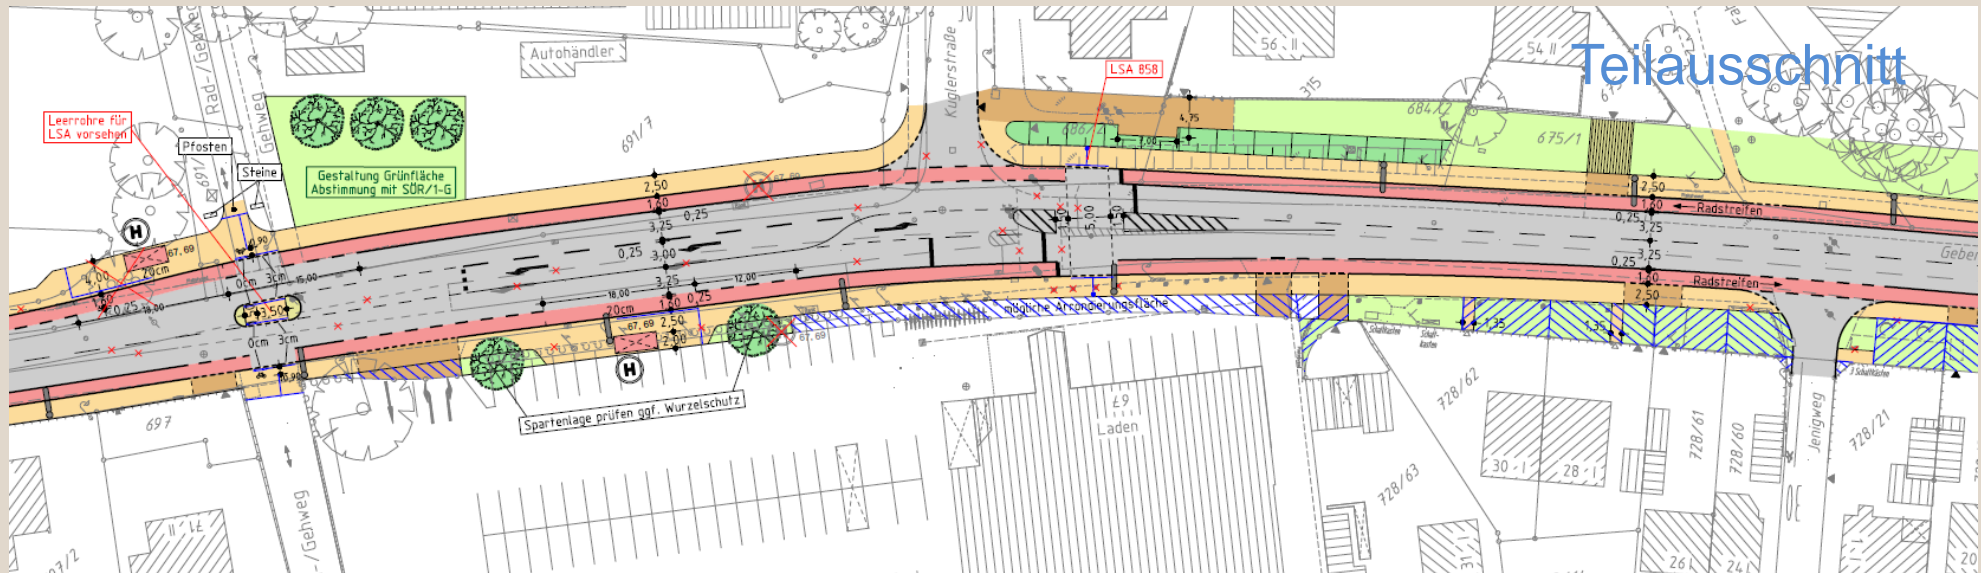


- Ausbau: Ausbaulänge ca. 530 m, Regelbreite 10,20 m
mit beidseitigen Radstreifen, Breite 1,60 m
6 neue Bäume
- Kosten: 5.038.000 € (davon 1.100.000 € aus Radwegeetat)
- Fertigstellung: März 2025

Gebersdorfer Straße



Sperberstraße

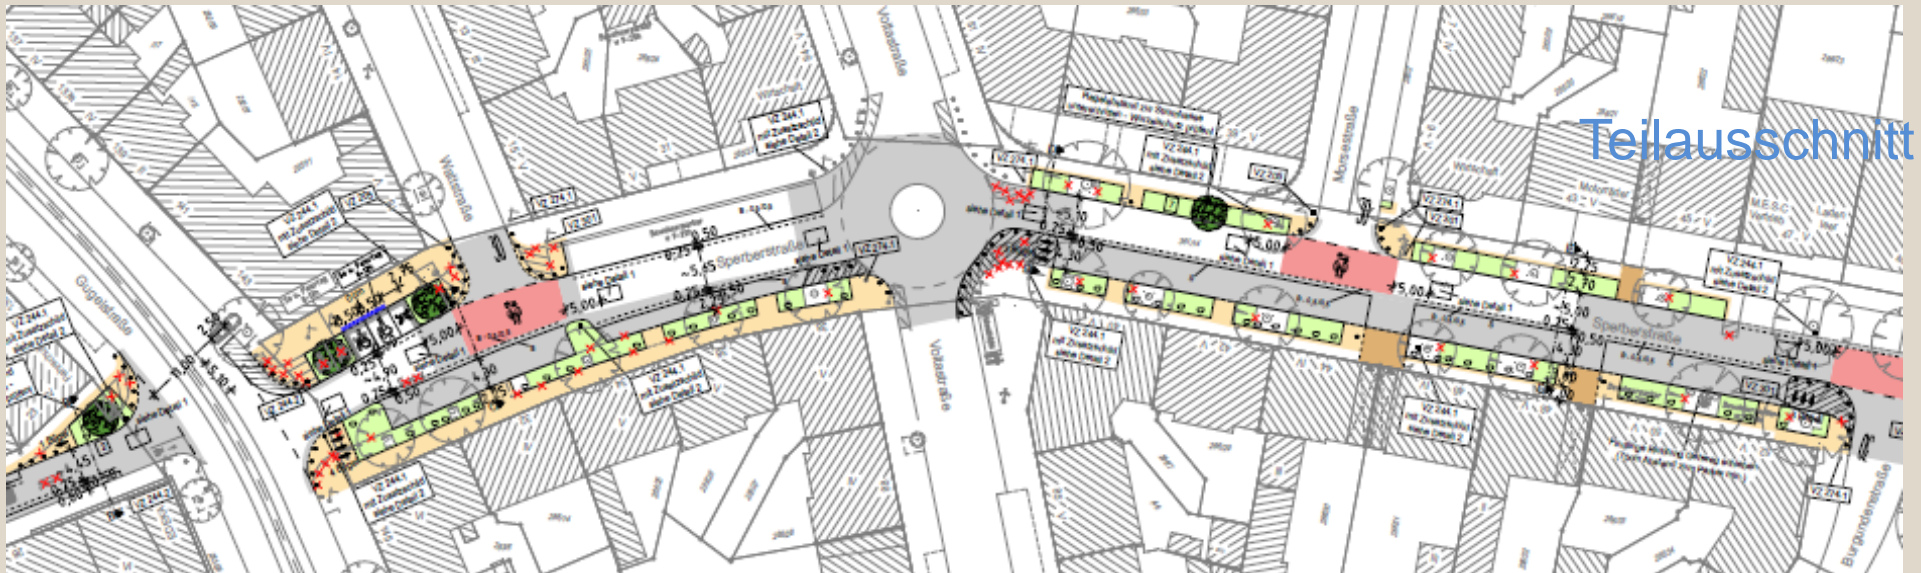


Teilausschnitt

- Ausbau: Fahrradstraße ca. 600 m; Breite ca. 5,80 m
Rotmarkierung in den Einmündungsbereichen
22 neue Fahrradstellplätze
6 neue Bäume
- Kosten: 968.000 € (davon 513.545 € aus Radwegeetat)
- Fertigstellung: Oktober 2025

Sperberstraße



Friedrichstraße - RSV Erlangen

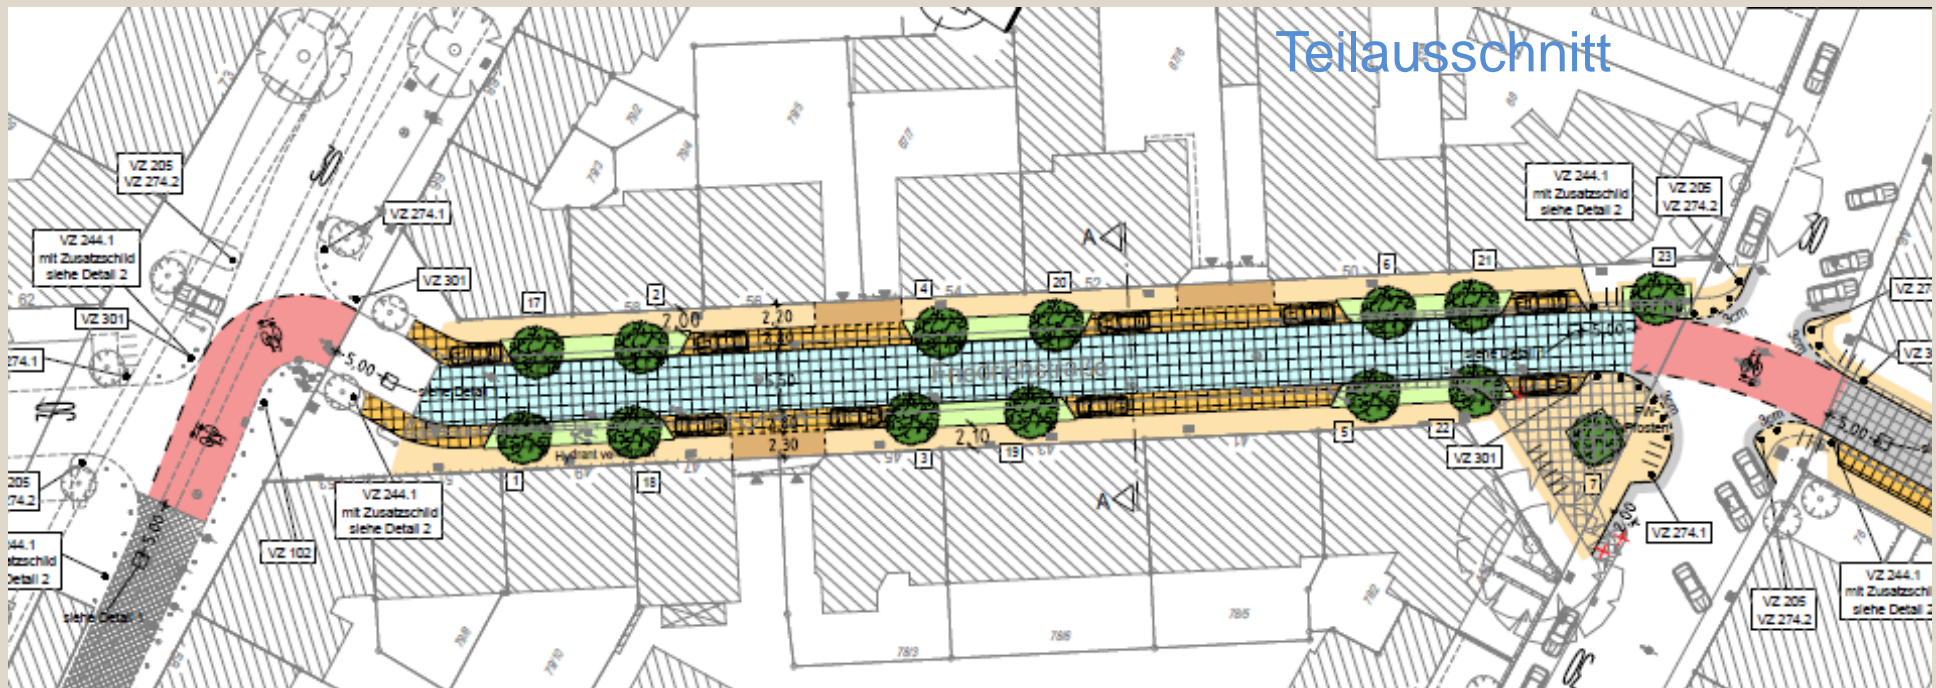


| | |
|-----------------|--|
| Ausbau: | Fahrradstraße ca. 1.700 m; Breite ca. 5,50 m Rotmarkierung in den Einmündungsbereichen 26 neue Bäume |
| Kosten: | 2.763.000 € (davon 1.500.000 € aus Radwegeetat) |
| Fertigstellung: | Herbst 2026 |

Friedrichstraße



Löbleinstraße - Meuschelstraße

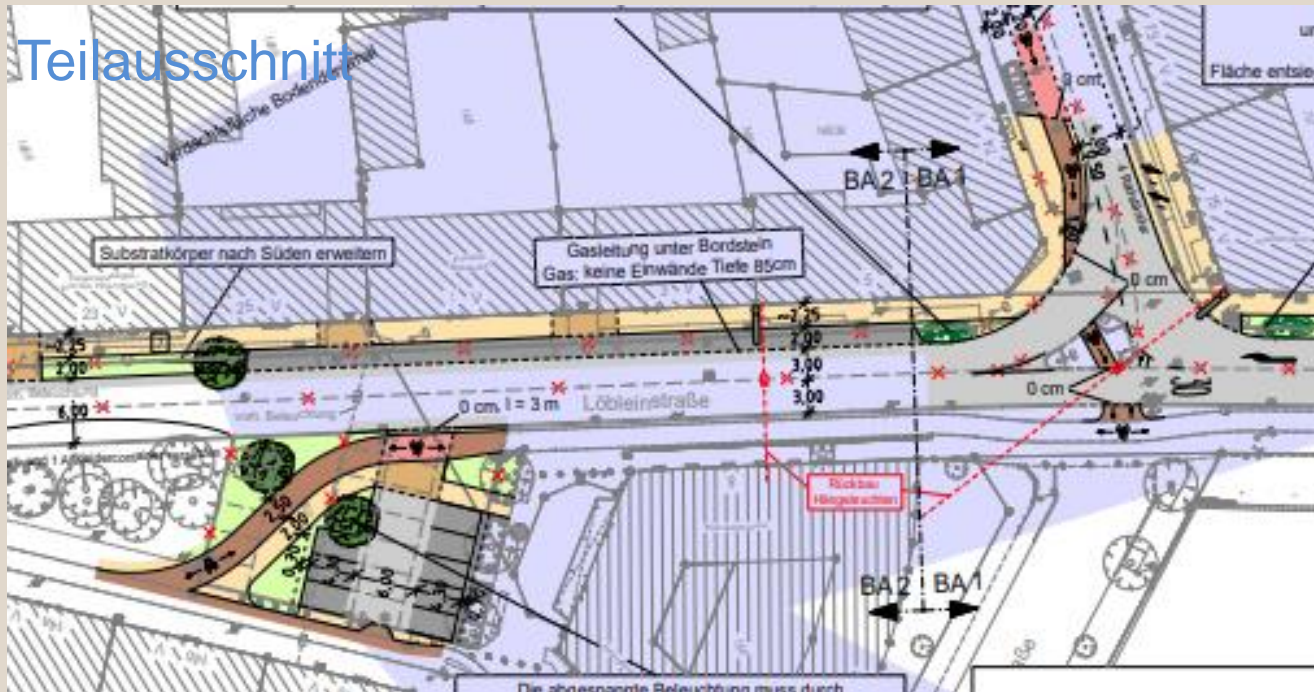

Ausbau: Ausbau eines Zweirichtungsradweges

32 Fahrradstellplätze

6 neue Bäume


Kosten: 1.470.000 €

Fertigstellung: Löbleinstraße fertig, Meuschelstraße Herbst 2025

Löbleinstraße



Gibitzenhofstraße

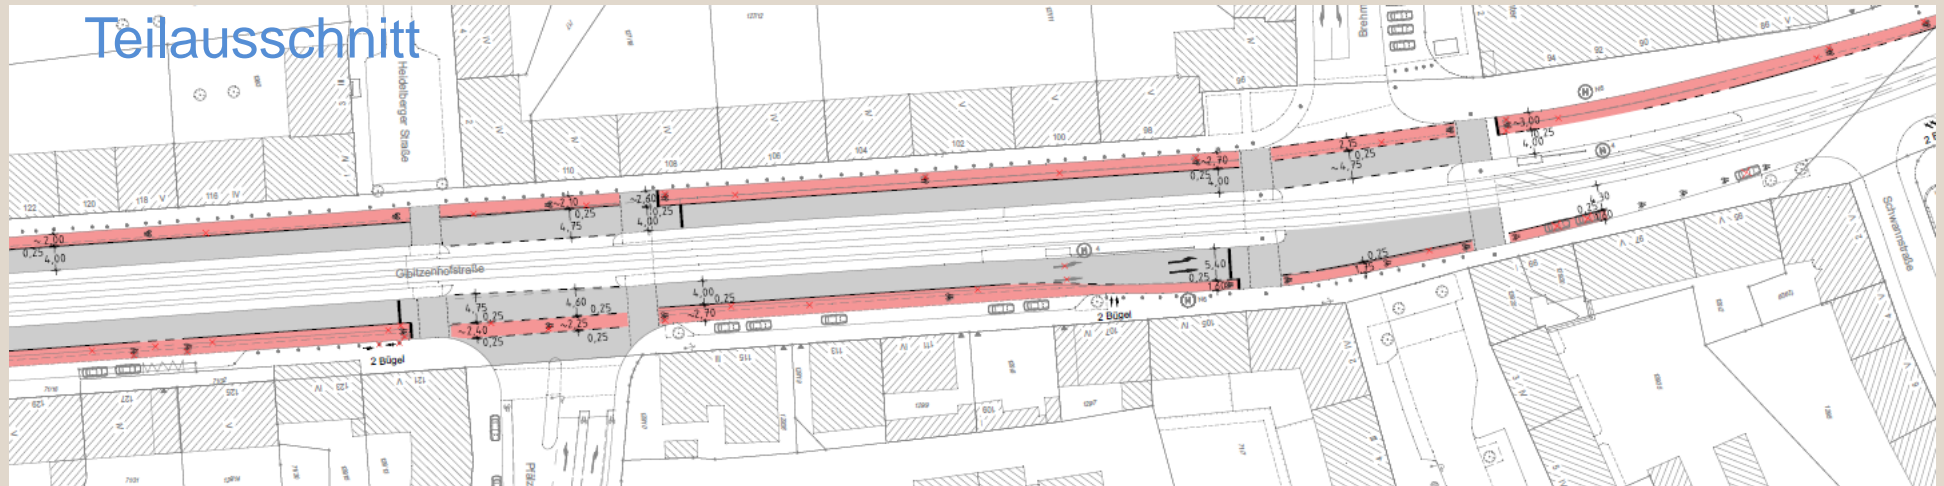

- Ausbau: Deckensanierung, Ausbaulänge ca. 840 m
 Radstreifen Breite von 2,00 m bis 2,75 m (3,00 m)
 Reduzierung der Fahrstreifenbreite auf 4 m
- Kosten: etwa 620.000 €
- Fertigstellung: Ostseite 2024, Westseite 2025

Gibitzenhofstraße



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

SÖR
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
SÖR/1-S/5
Sulzbacher Straße 2-6

90402 Nürnberg

Richard Gußner

+49 (0)9 11 / 2 31-7022
richard.gussner@stadt.nuernberg.de
<http://www.soer.nuernberg.de>
