

Bauprogramm Radwege 2026

36. Sitzung des Runden Tisches Radverkehr


17. März 2026

Bauprogramm 2026 – Sachstand Februar 2026



Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungszeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Radweg an der Goldbachstr.	150.000 €	nicht erforderlich	150.000 €		2025/2026	Baubeginn 9/2025 bis 4/2026
Kilianstr. Höhe Georg-Buchner-Str.	180.000 €	AfV 12.09.2022	180.000 €		2025 2026	Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung zusammen mit der Senefelder Straße
Cochläusweg, Lückenschluss	150.000 €	AfV 23.09.2021	150.000 €		2025 2026	verschoben in 2026 wg. Hochbaumaßnahme
Bayreuther Str. zw. Rathenauplatz und Berliner Platz	6.620.000 €	AfV 06.05.2021	2.448.000 €	4.172.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2026	im Bau
Spoehrstraße	998.000 €	18.7.2019	998.000 €		2025 2026/2027	Maßnahme verschoben
Zerzabelshofstr zw. DB-Unterführung - Pastoriusstraße	491.000 €	13.06.2024	150.000 €	341.000 €	2025 - 2026	Baubeginn 08/2025 - 06/2026
Zerzabelshofstr zw. Goldbachstr. - DB- Unterführung	441.000 €	21.02.2024	441.000 €		2025 - 2026	Baubeginn 08/2025 - 06/2026
Sulzbacher Straße zw. Harmonie- und Rudolphstr.	150.000 €	03.04.2025	150.000 €		2025/2026	Maßnahme im Zuge VAG Arbeiten fertiggestellt Rot-Markierung in 2026
Jansenbrücke Bereich Leyer Straße	1.235.000 €	11.07.2024	785.496 €	449.504 €	2026 / 2027	Antrag bei ZUG 23.10.2024 01.03.2026 Genehmigung Maßnahme in Vorbereitung
Maximilianstr. Kreuzung Adam-Klein-Str.	1.289.000 €	20.07.2023	911.981 €	377.019 €	2024 2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Bauzeit etwa 4/2026 - 10/2026 Maßnahme vergeben

Maximilianstraße / Adam-Klein-Str.

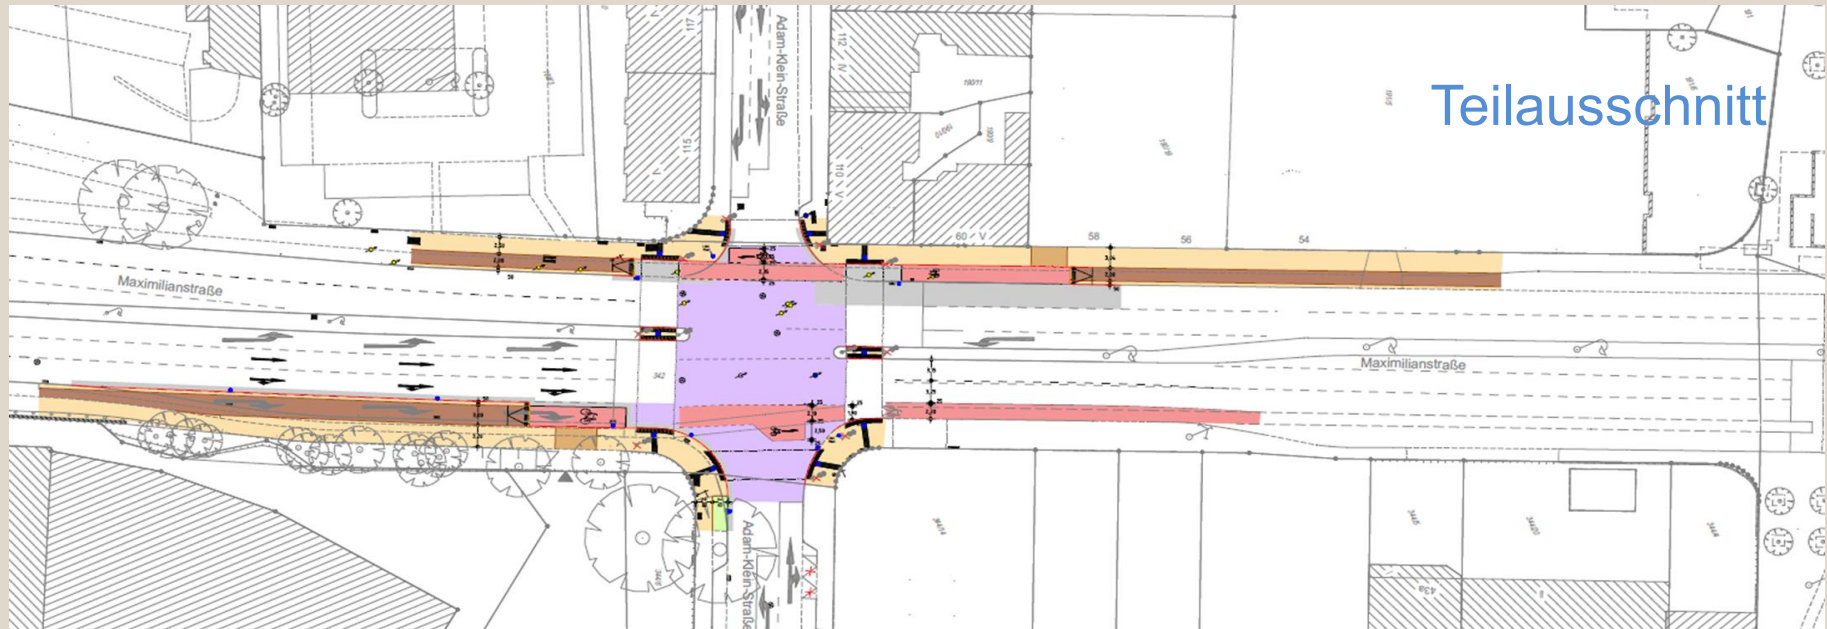

Ausbau: Knotenpunkt umbauen mit Rotmarkierung

Lichtsignalanlage erneuern

Kosten: 1.289.000 €

davon 409.000 € Anteil LSA

377.019 € Zuwendung NKI

502.981 € aus Radwegeetat

Bauzeit: März / April 2026 - Oktober 2026

Bauprogramm 2026 – Sachstand Februar 2026

Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Thumenberger Weg RVR 4 zw. Erlenstegenstr. und Flußstr.	22.689.000 €	29.01.2025 (Stadtrat)		22.689.000 €	2028-2031	Zuwendungsantrag BayGVFG in Vorbereitung Planung in Vorbereitung Spartenverlegung seit 5/2025 Arbeiten der DB 02/2026 - 04/2027
Allersberger Straße Kreuzung Annastraße	1.950.000 €	19.04.2024	110.000 €	1.840.000 €	2026 / 2027	Antrag bei ZUG 22.04.2025
Willstraße	1.423.000 €	12.09.2023	1.222.739 €	92.563 €	2026	Antrag bei ZUG 23.10.2024 Objektplan genehmigt Baubeginn 03/2026
Äußere Bayreuther Straße bei Leipziger Platz	700.000 €	16.01.2025	400.000 €	300.000 €	2027	Zuwendungsantrag in Vorbereitung
Oelser Straße	1.823.000 €	17.03.2022	661.350 €	1.161.650 €	2025 2027	Grunderwerb konnte trotz langwieriger Verhandlungen nicht vollzogen werden. Daran hängt die Umsetzung der Maßnahme.
Amberger Straße RSV Nbg-SC zw. Nopitschstr und Zweibrückener Straße Turnerheimstraße Holzwiesenstraße	5.421.000 €	17.03.2022 19.10.2023 BP 3478	1.084.200 €	4.336.800 €	2026 - 2027	Zuwendungsantrag am 29.08.2025 "Radoffensive Bayern" Baubeginn Mitte 2026 anvisiert

Bauprogramm 2026 – Sachstand Februar 2026


Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Fahrradstraßen						
1. BA RSV N-Er Friedrichstr., Schweppermannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg	2.763.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020	1.100.000 €	1.663.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2026	im Bau viele Verzögerungen wegen Spartenverlegungen und Fernwärmeausbau Anvisiere Fertigstellung 2026
Kleestraße (Stufe2, RVR 14)	658.000 €	16.11.2023	329.981 €	328.019 €	2025/2026	Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 29.7.2025 Baubeginn 9/2025
Schönweißstraße (Stufe 2)	360.000 €	11.09.2023	215.153 €	144.847 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbeschei vom 29.07.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Strauchstraße	1.948.000 €	21.09.2023	969.397 €	978.603 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 25.06.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Ausschreibung

Bauprogramm 2026 – Sachstand Februar 2026

Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Fahrradstraßen						
Senefelder Straße	1.466.311 €	14.12.2023	746.545 €	719.766 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Rehhofstraße	597.000 €	11.07.2024	213.135 €	383.865 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Happurger Straße	194.000 €	18.04.2024	88.863 €	105.137 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Schupfer Straße	404.000 €	18.04.2024	207.574 €	196.426 €	2025 2026	Antrag bei ZUG vom 10.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Strindbergstraße (RVR 10)	686.000 €	18.01.2024	357.981 €	328.019 €	2025 2026	Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 21.02.2025 Ausschreibung in Vorbereitung

RVR 10

Rehhofstraße – In der Finstermail – Happurger Straße Schupfer Straße - Strindbergstraße

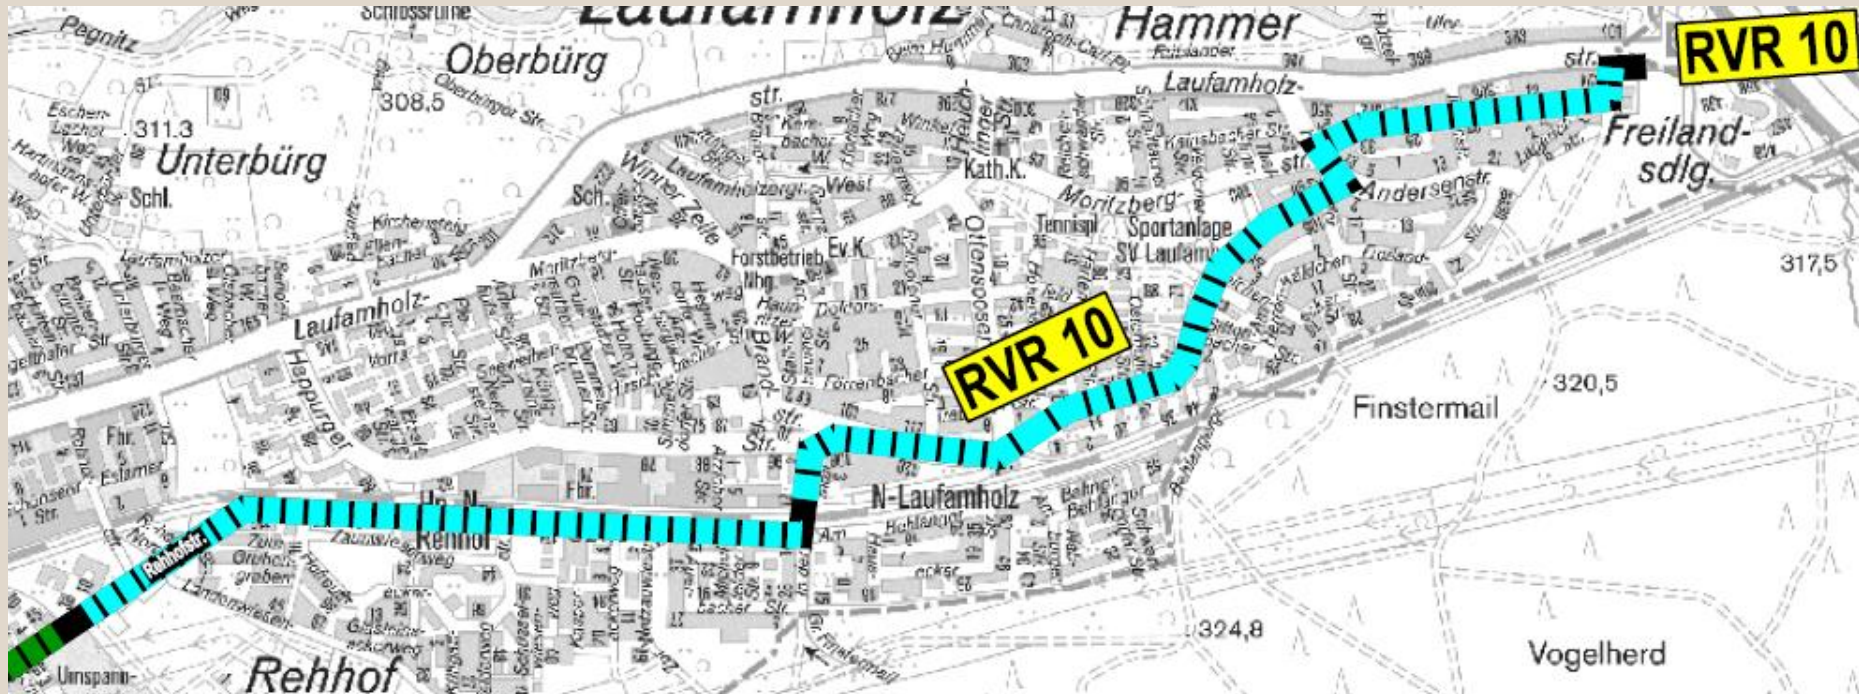

Ausbau: 3150 m Fahrradstraße, 4,00 bis 6,70 m breit

Kosten: 1.881.000 €

davon 1.013.447 € Zuwendung NKI

867.553 € aus Radwegeetat

Bauzeit: Juni 2026 - Mai 2027

Bauprogramm 2026 – Sachstand Februar 2026

Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Fahrradstraßen						
Frankenstraße	958.000 €	18.04.2024	306.600 €	651.400 €	2025/2026	Städtebauförderung vom 02.07.2025. Verzögerungen wegen Archäologie Baubeginn 9/2025 Fertigstellung 5/2026
Am Thoner Espan, Michelstraße	760.000 €	18.04.2024	435.960 €	324.040 €	2026	Antrag bei ZUG 13.10.2024 In Bearbeitung bei ZUG Maßnahme in Vorbereitung
Forsthofstraße	1.327.667 €	18.04.2024	719.702 €	607.965 €	2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 29.07.2025 Maßnahme verschoben wegen Bauarbeiten in der Allersberger Straße
Felsenstraße	740.000 €	11.07.2024	293.087 €	446.913 €	2025 2027	Antrag bei ZUG 13.08.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung

Bauprogramm 2026 – Sachstand Februar 2026

Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Fahrradstraßen						
Schleifweg	675.000 €	20.02.2025	610.000 €	65.000 €	2025/2026	Bauzeit 9/25 - 3/26
Eichendorffstraße - Stufe 1 zw. Schafhofstr. und Stadenstr.	389.000 €	13.06.2024	150.000 €	90.000 €	2025/2026	Markierung bereits aufgebracht Bushaltestellen in 2026
Äußere Cramer-Klett-Straße Krzg Gießereistr./ Wöhrder Hauptstr.	550.000 €	22.01.2026	550.000 €		2026	Umsetzung im Zuge der LSA-Sanierung
Forchheimer Straße RVR 4	315.000 €	19.09.2024	315.000 €		2026/2027	
Elisenstraße / Hintere Marktstr. Sandreuthstr. RVR 2	800.000 €	17.10.2024	800.000 €		2026/2027	Umsetzung abhängig vom Investor "Lochner Straße"
Veillodter Straße	680.000 €	14.12.2023	680.000 €		2027	Umsetzung abhängig von den Hochbaumaßnahmen
Am Messehaus zw. Welser Straße und Rennweg	75.000 €	16.01.2025	75.000 €		2026	Markierungsplan
Carl-Schurz-Str. + Bessemer Str. RVR 4	241.000 €	26.06.2025	241.000 €		2026	
Falknerweg und Hugo-Distler-Str. RVR 4	200.000 €	26.06.2025	200.000 €		2027	Gründerwerb offen

Bauprogramm 2026 – Sachstand Februar 2026

Maßnahme	geschätzte Gesamt-kosten	AfV-Beschlus	Finanzierung Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs- zeitraum	Stand der Maßnahmenumsetzung
Weiter Maßnahmen in Vorbereitung						
Kleinreuther Weg RSV ER zw. Nordring und Kilianstr	3.066.000 €	14.12.2023	3.066.000 €		2027	
Kleinreuther Weg RSV ER Lohestraße	1.708.000 €	14.12.2023	1.708.000 €		2027	
Wirthstr. RVR 2	1.000.000 €	19.09.2024	1.000.000 €		2027	Umsetzung wegen Verkehrsführung noch offen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

SÖR
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
SÖR/1-S/5
Sulzbacher Straße 2-6

90402 Nürnberg

Richard Gußner

+49 (0)9 11 / 2 31-7022
richard.gussner@stadt.nuernberg.de
<http://www.soer.nuernberg.de>
